

Кабельный журнал прокладки по крыше контейнеров:

От трансформатора ТМГ 630 до контейнеров №1 и №2:

К1.1 – 45м (АВВГнг-LS 4х240)

К1.2 – 45м (АВВГнг-LS 4х240)

К2.1 – 64м (АВВГнг-LS 4х150)

К2.2 – 64м (АВВГнг-LS 4х150)

От трансформатора ТМГ-400 кВт до контейнеров №3 и №4:

К3.1 – 35м (АВВГнг-LS 4х150)

К3.2 – 35м (АВВГнг-LS 4х150)


К4.1 – 41м (АВВГнг-LS 4х150)

К4.2 – 41м (АВВГнг-LS 4х150)

Общая длина кабелей

АВВГнг-LS 4х150 – 280м

АВВГнг-LS 4х240 – 90м

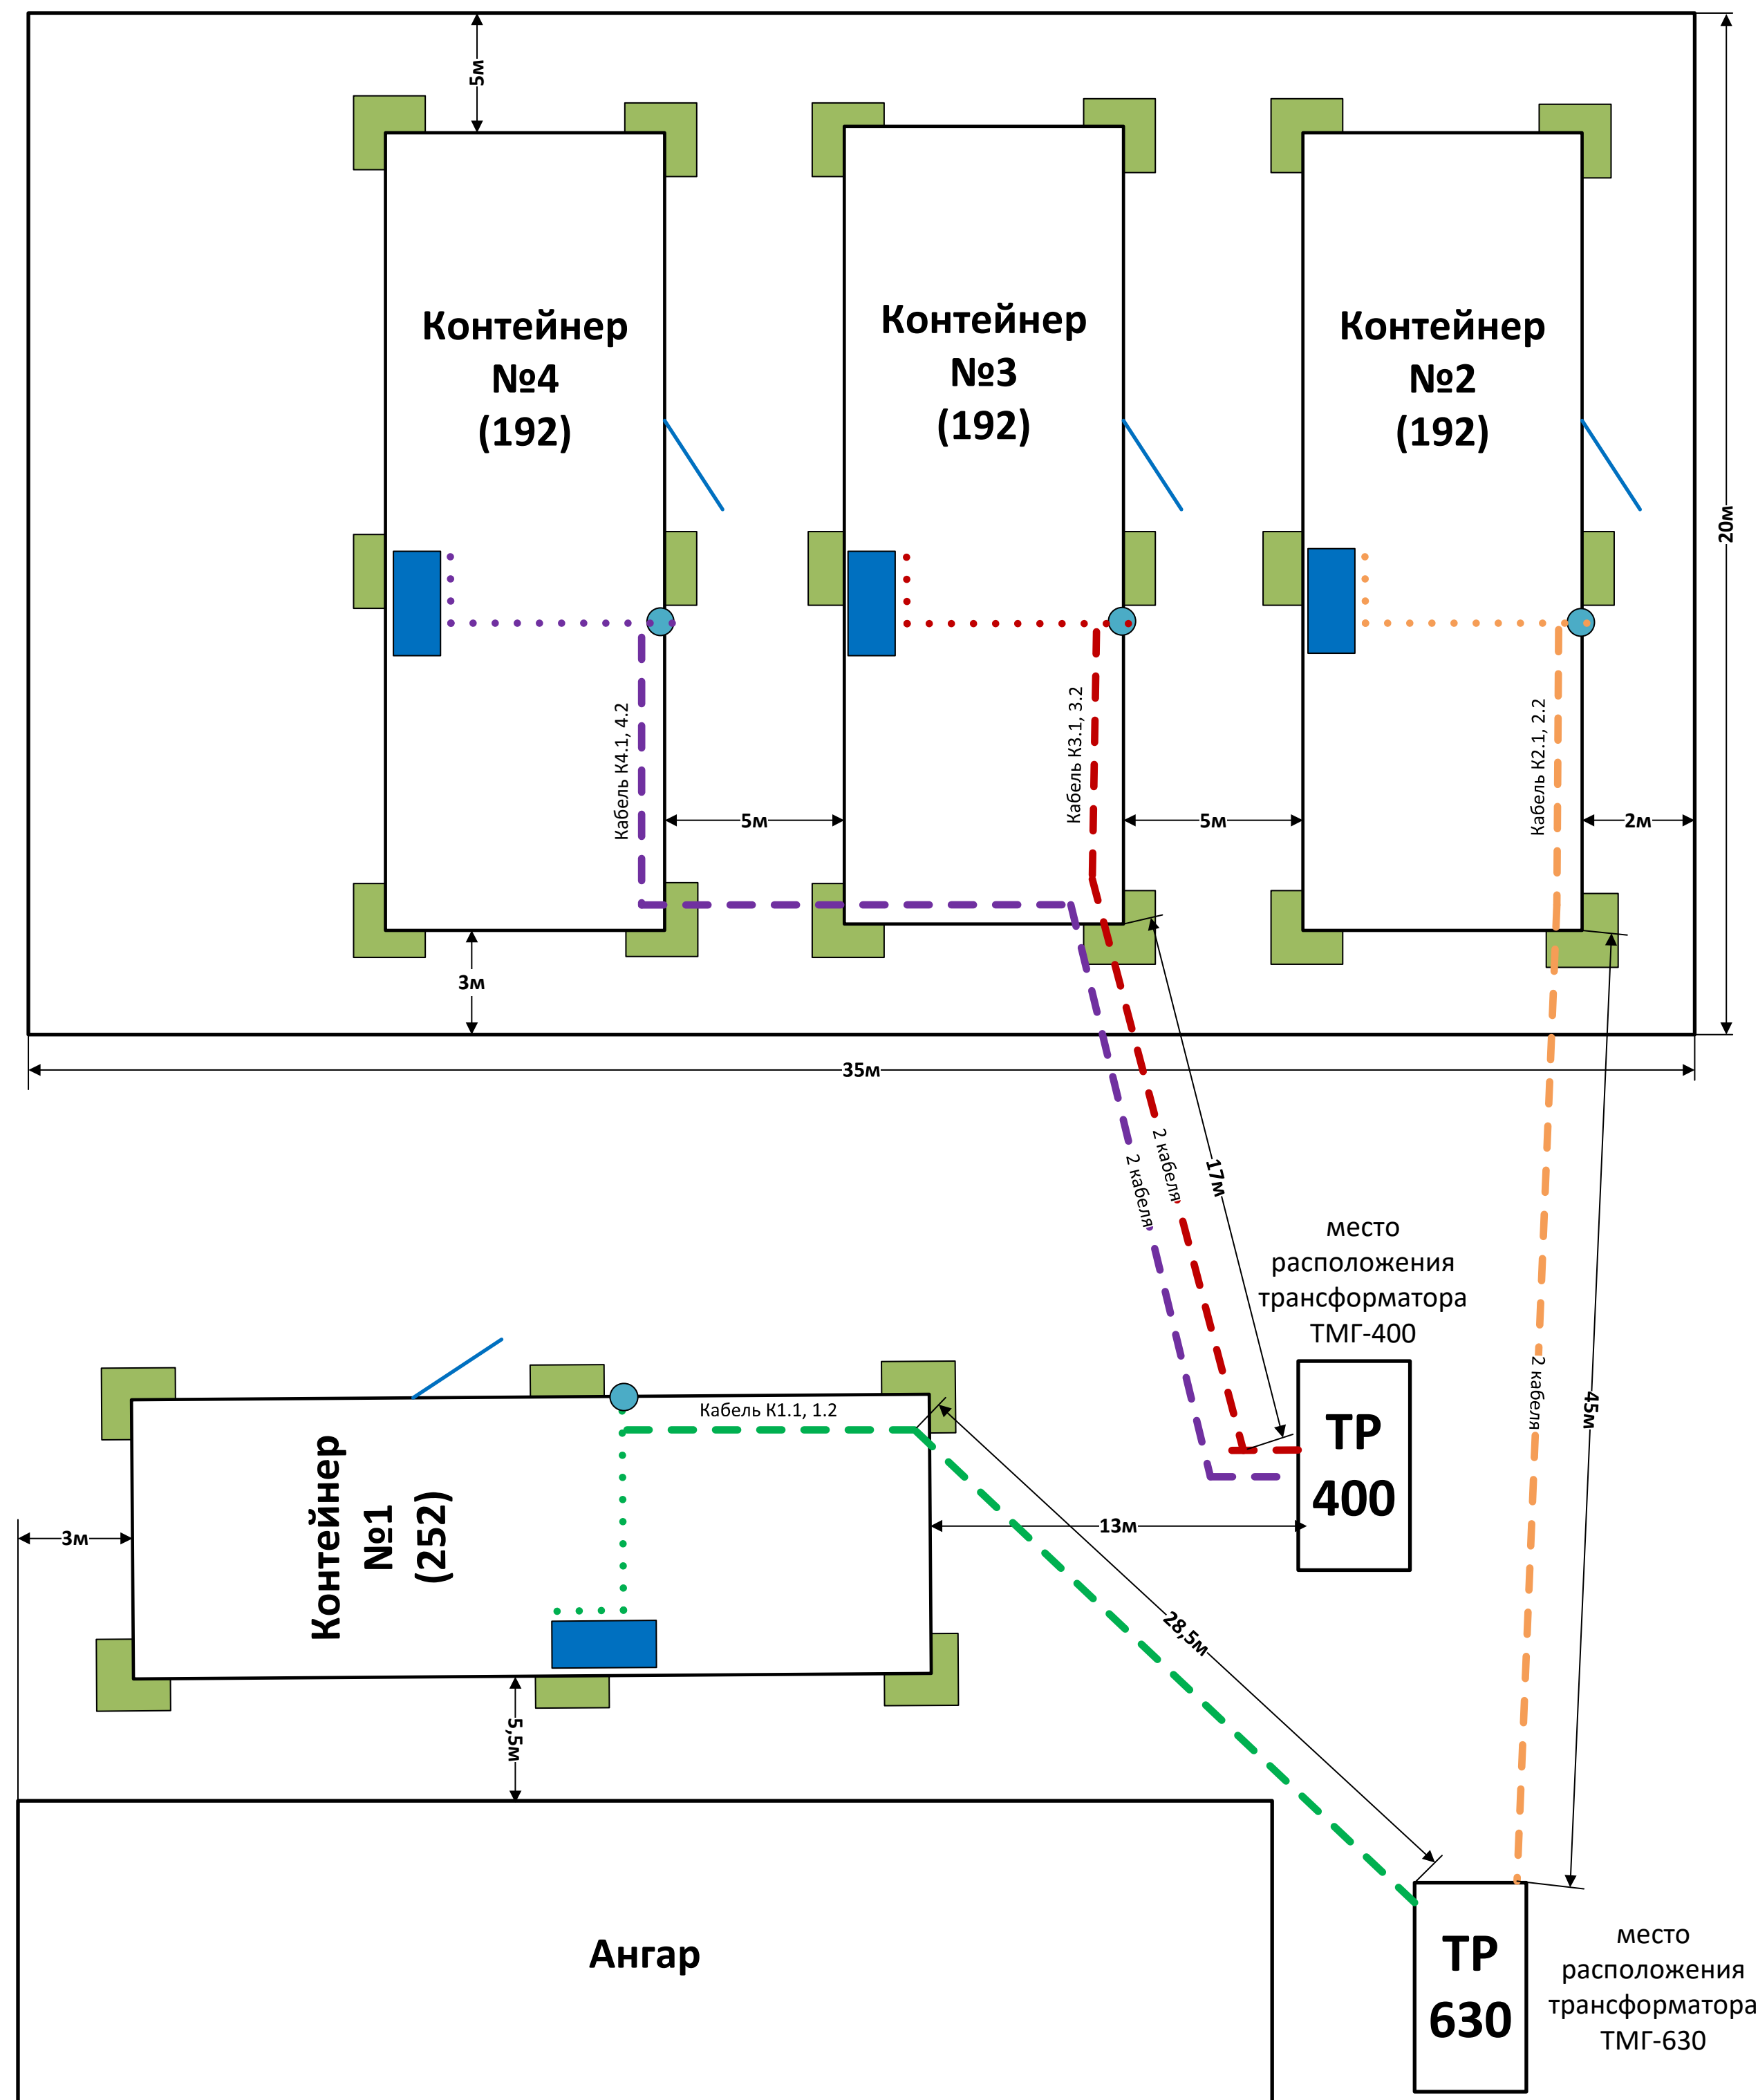

Въезд на
площадку
